株式会社 サンアイ岡本

セッパンガレージ サンメイト 施工上の注意事項

このたびは、当社製品をご採用いただきまして誠にありがとうございます。
製品の施工には、本書およびサンメイト組立説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

■施工は必ず専門業者が行ってください。

専門知識のない方が施工されますと、不具合の原因となる場合があります。

■製品の破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項を必ずお守りください。

施工の前に

- 梁は重量がありますので、ユニック車やクレーンの使用、または必要人数を確保してください。
- 本製品は簡易型車庫です。物置・遊び場あるいは住居の一部などへの転用を目的として、みだりに改造・変更をしないでください。
- 建物の屋根からの落雪を直接受けない位置に設置してください。
- 塀などに隣接して設置する際には、風のあおりによる接触防止のため、間隔を十分あけてください。
- 強風地域、特に崖上、風の通り道上などでの施工は避けてください。
- 給湯器や暖房機器などの排気ガスまたは車の排気ガスが製品に直接当たったり、滞留するような場所には施工しないでください。塗装の劣化・剥離や排気による中毒のおそれがあります。
- 傾斜地に設置する場合は、低い場所の埋め込み深さを確保してください。

施工上の注意事項

《基礎工事について》

- 基礎は当社指示寸法以上にしてください。
- 基礎コンクリート打設は、柱に梁を固定し、ルーフをふせ、柱のピッチ、垂直、梁の水平などを確認してから行ってください。
- 地下埋設物（給排水管、電線管など）に影響を与えないようにご注意ください。
- コンクリートやモルタルに海砂および凝結促進剤・減水促進剤・凍結防止剤などを使用しないでください。腐食の原因となります。
- 養生期間は十分（4日～7日）にとり、期間中は重いものをのせたり振動させたりしないよう指示してください。
- コンクリートやモルタルが製品の表面に付着した場合は、速やかに取り除いてください。

《製品について》

- ボルト、ねじは当社指定品を使用し、ゆるまないように確実に締付け固定してください。
- アルミ部材が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造や、指定以外の加工、指定の部品やオプション品以外の使用はしないでください。
- シーリング材、接着剤は現地調達品です。

施工の後に

- 同梱されている取扱説明書は、必ず施主様へお渡しください。



株式会社 サンアイ岡本

SE-Z-020_R0 20140523

セッパンガレージ **サンメイト　ポリカ・FRPルーフ組立説明書**

施工は必ず専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと、不具合の原因となる場合があります。

ポリカ・FRPルーフの取付け

先に鋼板製ルーフを伏せ、次にポリカ・FRPルーフを鋼板製ルーフの上から伏せてください。
ポリカ・FRPルーフはポリカ用3点セットで固定してください。
※ポリカ・FRPルーフは並べての取付け、端部への取付けはできません。

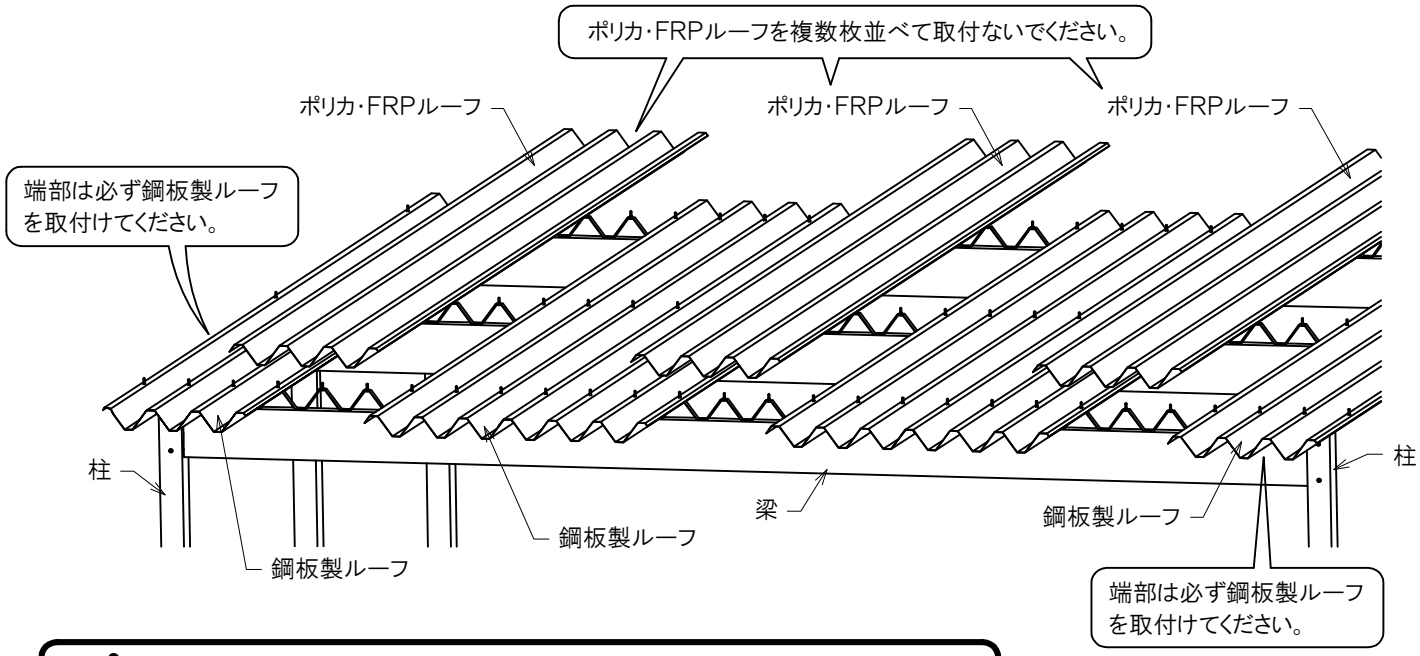

ポリカ・FRPルーフはポリカ用3点セットで固定してください。

3点セット　　ポリカ用3点セット



注意 通常の3点セットはパッキンが接着されていますが、
ポリカ用3点セットはパッキンが接着されていません。
